

ミニウォール工法施工実績

工事概要

- ◆ 工事名称 : 村松川災害復旧工事
- ◆ 工事場所 : 茨城県那珂郡東海村大字村松地内先
- ◆ 発注者名 : 茨城県東海村役場
- ◆ 施工者名 : 河野工務店
- ◆ 施工時期 : 平成25年5月～6月
- ◆ 施工機械 : 350型
- ◆ 芯材タイプ : KT150B L=5.0m
- ◆ 施工延長 : 100.0m (右岸52.0m、左岸48.0m)
- ◆ 地盤特性 : 砂質土、礫質土 (N=16～50)
- ◆ 施工概要 : 河川改良工事においてコンクリート矢板が計画され、地盤状況からミニウォール工法が最適と判断され採用となった


工事完了写真



施工状況全景



施工図・柱状図

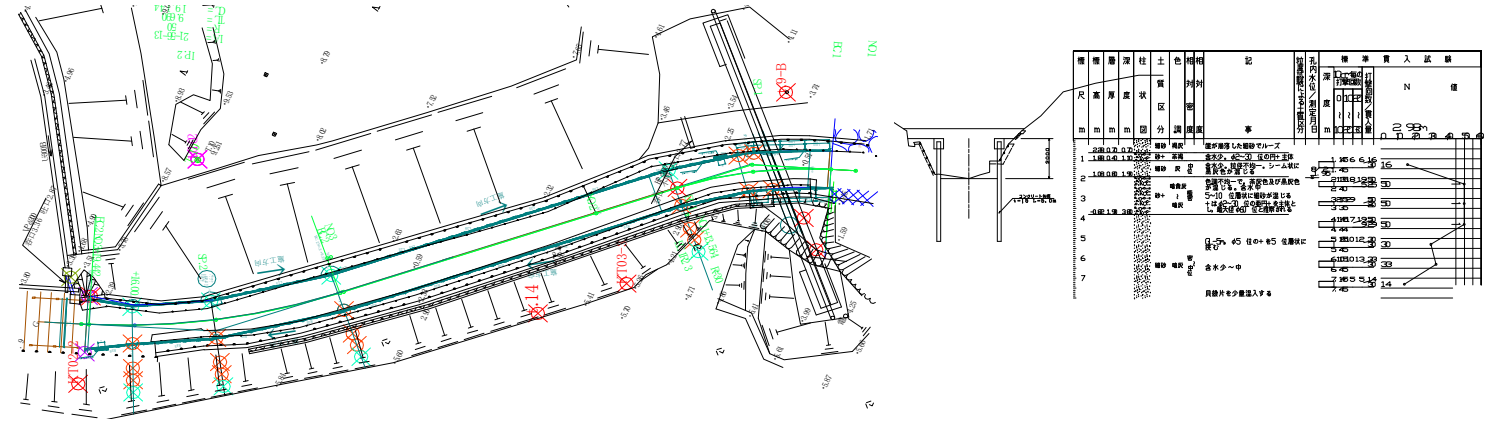

工事施工記録



掘削状況



コンクリート矢板建込状況



コンクリート矢板建て込み完了端末部



コンクリート矢板建て込み完了
